

PN - Policía Nacional del Ecuador
Dirección Nacional de Salud
Hospital Guayaquil

PROYECTO: I010 Instalación de una nueva acometida eléctrica, para los equipos de climatización del hospital.

Líder del Proyecto:	Vargas Cañar, Franco (fvargas@hdpng2.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón	Programas Relacionados:	
Titular:	Torres Arboleda, Carlos Fabián	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/01/2015 - 15/05/2015
Fecha de última actualización:	06/03/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Torres Arboleda, Carlos Fabián	Fecha del siguiente Hito:	19/03/2015

DATOS GENERALES

Descripción

Realizar una nueva acometida eléctrica para centralizar las cargas y mejorar el rendimiento del Breaker de 630 A/3P, que se encuentra en el tablero de distribución principal el mismo que fue diseñado para proteger la carga identificada como TPN 1-4 (cargas del primero al cuarto piso).

Beneficios Cualitativos

Acometida Eléctrica para los cuatros pisos del hospital.

Tipo de Beneficiario

INTERNO: Personal Medico, Personal Tecnico y Administrativo

EXTERNO: Usuarios de esta Casa de Salud.

Restricciones

TIEMPO: Que el Proyecto debe de terminar en el tiempo estipulado según cronograma.

COSTO: El valor del proyecto no debe sobrepasar el valor calculado en el cronograma valorado


ALCANCE: Se debe realizar el proyecto de acuerdo a lo establecido en los términos referenciales.

RESULTADOS: Instalación eléctrica para el funcionamiento de los aires acondicionados.

Fase Actual: Anteproyecto Definición **Planeación** Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 61.07 %
 Fecha de Inicio: 05/01/2015 Fecha de Fin: 15/05/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

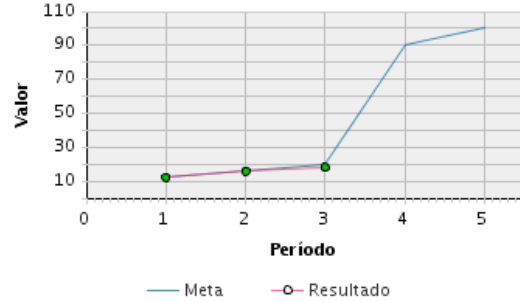

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	12 %	16 %	20 %	90 %	100 %							
	Avance real acumulado											
	12 %	16 %	18 %									
Estado												
	●	●	●									

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Marzo 05: Se eleva al portal de compras publicas el respectivo proyecto (Hito relacionado 6)	Torres Arboleda, Carlos Fabián	06/03/2015 - 10:20 AM
Febrero 20: Se procede a dar inicio al análisis de pliegos para la contratación y subida al portal de Compras Publicas. (Hito relacionado 5) Febrero 06 .- Se dispone elaborar la resolución motivada mediante memorando No. 2183-DA-HDPNG2 (Hito relacionado 4)	Torres Arboleda, Carlos Fabián	06/03/2015 - 10:19 AM
Enero 22 .- Se desarrolla el Plan del Proyecto (Hito relacionado 3). Enero 15.- Se aprueba el ACTA DE CONSTITUCION del proyecto (Hito relacionado 2). Enero 08.- Se llama a reunion para la elaboración del Acta de Constitución. (Acta de Reunion No.001). Enero 05.- Se recibe por parte de la DIRPLAN la aprobación del proyecto (Hito relacionado 1).	Torres Arboleda, Carlos Fabián	05/02/2015 - 04:54 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	2- NACIONAL. * General. Falta de asignación presupuestaria CAUSARIA que no se ejecuten el proyecto	06/03/2015	Gonzalo Manuel Vinueza Espinoza	60 %	70	42	0/1

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Documento validado.	1-Solicitud de Información	05/01/2015		05/01/2015		Sí	0.0
2	DEFINICIÓN: Acta de Constitución aprobada.	1-Solicitud de Información	15/01/2015		15/01/2015		Sí	10.0
3	PLANIFICACIÓN: Plan del proyecto aprobado.	1-Solicitud de Información	22/01/2015		22/01/2015		Sí	2.0
4	PLANIFICACION: Resolución motivada para la contratación, aprobada	1-Solicitud de Información	06/02/2015		06/02/2015		Sí	2.0
5	PLANIFICACION: Analisis de pliegos para la contratación, iniciado	1-Solicitud de Información	20/02/2015		20/02/2015		Sí	2.0
6	PLANIFICACIÓN: Procesos pre contractuales, iniciado.	2-Publicación de Pliegos	05/03/2015		05/03/2015		Sí	2.0
7	PLANIFICACIÓN: Acta de adjudicación, aprobada	3-Adjudicación	19/03/2015	19/03/2015			No	2.0
8	EJECUCIÓN: Primer Anticipo, entregado	4-Inicio de Trabajo	08/04/2015	08/04/2015			No	50.0
9	EJECUCIÓN: Avances del proyecto informado	5-Entregables Intermedios	20/04/2015	20/04/2015			No	10.0
10	EJECUCIÓN: Avances del proyecto informado	5-Entregables Intermedios	30/04/2015	30/04/2015			No	10.0
11	CIERRE: Acta entrega recepción aprobada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	13/05/2015	13/05/2015			No	5.0
12	CIERRE: Informe final de la entrega obra realizada.	9-Entregables Formales	14/05/2015	14/05/2015			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

12	Incrementar la satisfacción de los usuarios en los Servicios de Salud MEDIANTE convenios con la red complementaria, la remodelación de la infraestructura, adquisición de tecnología médica de punta, capacitación al talento humano, e implementación de las TICs, y aplicación de encuestas periódicas a los usuarios, gestionar el incremento de médicos especialistas.
13	Incrementar el uso optimo del presupuesto MEDIANTE una adecuada gestión, planificación, ejecución y monitoreo del presupuesto asignado para el aprovisionamiento de insumos medicinas, mobiliario y mantenimiento de equipos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 2 Acta Constitucion	Acta_Constitucion_Acometida_Electrica.PDF	06/03/2015
2	ASOCIACIÓN HITO 1 .- VALIDACIÓN DEL PROYECTO	acomet_electrica.anteproy.PDF	23/01/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Nieto Ronquillo, Edward	Líder Técnico

Nombre	Rol
Torres Arboleda, Carlos Fabián	Patrocinador del Proyecto
Vargas Cañar, Franco	lider del Proyecto
Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón	Patrocinador Ejecutivo
Vinueza Espinoza, Gonzalo Manuel	Patrocinador Financiero
