

PN - Policía Nacional del Ecuador
Dirección Nacional de Salud
Hospital Quito

PROYECTO: I053 HQ No.1 Adquisición e Instalación de Mobiliario Para la Nueva Consulta Externa

Líder del Proyecto:	Paredes Vizcaino, Jose Alfonso (jsalfonsoparedes90@yahoo.com)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón	Programas Relacionados:	
Titular:	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	Prioridad:	5
Tipo de Proyecto:	Activos Fijos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	717,690.52
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	26/06/2013 - 27/02/2015
Fecha de última actualización:	18/02/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	Fecha del siguiente Hito:	25/02/2015

DATOS GENERALES

Descripción

Convertido del Proyecto de Inversión K016 el 28/01/2014
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La Instalación de mobiliario para la Nueva Consulta Externa permitirá contar con una área de 54 consultorios debidamente equipados con la finalidad de ampliar los servicios de Salud en la Consulta Externa, especialmente el horario de atención ya que se ve limitado por la falta de espacio físico, en un consultorio atiende 2 y 3 especialistas con diferentes horas, lo que incide directamente en el déficit de calidad en la atención.
LINEA BESE: El promedio de pacientes atendidos en la consulta externa es 110.000 pacientes al año con lo que se espera ampliar la cobertura.
PRODUCTO: El listado de los ítem a adquirirse se detallan en el listado del requerimiento entre los que consta: 1 armario para medicinas, 1 armario para ORL, 15 módulos con tapa superior para instrumental, 29 módulos pequeños para instrumental, 30 taburetes con respaldo, 10 sillas para exploración y toma de sangre, 116 Módulo de retirada con sensor de apertura de 20 litros, carro de yesos, 36 biombos de 3 cuerpos, silla oftálmica, 6 mesas para cafetería, 40 sillas para cafetería, 6 Counter para cafetería, información, y enfermería, modular auxiliar para secretaría, recepción y enfermería, modular auxiliar para secretaría, recepción entre otros.
OBJETIVO GENERAL: Adquirir el mobiliario necesario para el funcionamiento de la Nueva Consulta Externa.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la calidad de atención en la Consulta Externa en cuanto a la accesibilidad los turnos y oportunidad en la atención.

Beneficios Cualitativos

La implementación de mobiliario en la Nueva Consulta Externa, permitirá contar con un área física óptima acorde a los requerimientos de la población policial, además permitirá extender los Horario de atención de acuerdo a la especialidad con lo que estamos ampliando la cobertura en el área ambulatoria. De igual forma se brinda la posibilidad de ampliar los espacios físicos de otros servicios que se encuentran reducidos

Tipo de Beneficiario

USUARIOS INTERNOS: Los beneficiarios de este proyecto son pacientes que acuden al hospital en busca de atención médica, beneficiarios del seguro de enfermedad y maternidad del ISSPOL.
USUARIOS EXTERNOS: pacientes referidos a través de la RED DE SALUD hacia el Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacional .


Restricciones

ALCANCE.- La falta cumplimiento de la empresa ocasionaría un desfase en la programación para su inauguración a pesar de que ya existe un retraso de en la entrega del edificio.
TIEMPO.- El tiempo de duración para el proyecto es de 2 meses a partir de la entrega del anticipo.
COSTO.- El costo proyectado para la ejecución del Proyecto es de 1'435.381,05 dólares americanos.
CALIDAD.- La calidad de los productos que se describen en el contrato adjunto.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------------------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 26/06/2013 Fecha de Fin: 27/02/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

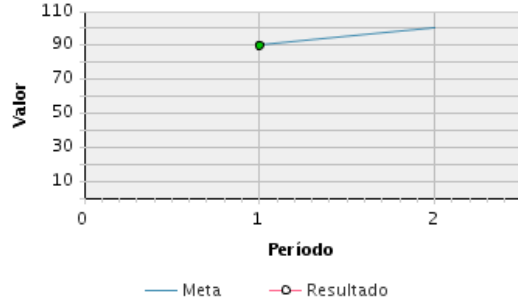

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	90 %	100 %										
	Avance real acumulado											
	90 %											
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2015.- 1.- Mediante oficio 2015-001-P4-HQPN, Suscrito por el Sr: Jefe de Logística (E) de esta casa de Salud, en el que solicita se amplíe el plazo para el cierre de Proyecto en razón de que no se ha cancelado la totalidad del contrato. ASOCIACIÓN AL HITO 18 2.- Mediante memorando No. 2015-028-DHQ-PN de fecha 07-01-2015 suscrito por Sr: Director del Hospital en el que autoriza y dispone se realice el trámite correspondiente, hasta disponer de los recursos económicos para la cancelación del contrato. ASOCIACIÓN AL HITO 18</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	05/02/2015 - 03:55 PM
<p>DICIEMBRE 2014: 1.- Mediante Oficio N° 2014-677-P4-HQPN, de fecha 4 de diciembre del 2014, suscrito por el señor Sgop. Ing. Alfonso Paredes Administrador del Contrato, remite el Informe para la Adquisición e Instalación de Mobiliario para la Nueva Consulta Externa de esta Casa de Salud con la empresa VIA PROYECTOS S.A. según contrato N° 2013-118-AJ-HQ-PN. ASOCIACION AL HITO 16. 2.- Mediante oficio No. 2014-332-A C-JF-HQPN, suscrito por la Sra: Ing. Jimena Espinosa, delegada del Dpto. Financiero remite Acta de Entrega recepción del Mobiliario para la Nueva Consulta Externa según contrato No.2013-118-AJ-HQ-PN con el respectivo informe financiero. ASOCIACIÓN AL HITO 17</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	05/01/2015 - 09:16 PM
<p>NOVIEMBRE 2014 1.- Mediante memo 2014-067-GPR-HQPN, de fecha 01 de diciembre de 2014, suscrito por el Sr. TCnel de Policía Dr. Leonardo Bravo Amores, quien dispone se realice un informe de los sobre avances de la contratación de mobiliario para la nueva Consulta Externa. ASOCIADO AL HITO 16 2.- Mediante oficio No. 2014-006-CE-HQ-PN, de fecha 21 de Noviembre del 2014 suscrito por el Sr. TCnel de Policía Dr. Galo Madera, Jefe de la Consulta Externa remite información sobre la situación actual de la Consulta Externa. ASOCIADO AL HITO 15</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	06/12/2014 - 07:09 AM
<p>OCTUBRE 2014 1.- Con memorando No. 2014-5691-DHQ-PN, de fecha 28-10-2014 el Sr. Director del Hospital Tcnel. Dr. Alfredo Proaño dispone la conformación de la comisión para la recepción de Mobiliario de la Nueva Consulta Externa. ASOCIACION HITO 15 2.- Mediante oficio No. 2014-073-GPR-HQPN, de fecha 31 de Octubre se solicita información sobre avances del contrato de Mobiliario para la Consulta Externa al Ing. Alfonso Paredes líder del Proyecto. ASOCIACION HITO 15 3.- Con memorando No. 2014-358-P4-HQ-PN, El Sr. Ing. Alfonso Paredes informa que el contrato se encuentra en Proceso de recepción a su vez esta conformada por: Ing. Alfonso Paredes, Administrador del Contrato. Sgto.S Cecilia Zapata coordinadora de Bodega y Suministros y Cbo.S Julyssa Alfaro Chávez, Jefe del Dpto. de Activos Fijos. la Misma que se llevará a cabo el día 30 de Octubre del 2014. ASOCIACION HITO 15</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	05/11/2014 - 10:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2014:</p> <p>1.- Mediante Memorando N° 2014-4315-DHQ-PN, de fecha 25 de agosto del 2014, suscrito por el señor Director Administrativo de esta casa de salud, para la conformar la Comisión para la recepción del Edificio de la Nueva Consulta Externa y sus instalaciones del Hospital Quito N° 1 de la Policía Nacional, conjuntamente con los señores miembros de la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional., por ausencia del señor Administrador del Contrato y representantes de la Constructora se suspende dicha diligencia.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	04/09/2014 - 01:39 PM
<p>JULIO 2014:</p> <p>1.- Mediante Memorando N° 2014-5835-DNS-PN, solicita e informa que para alcanzar la autorización por parte del Ministerio de Interior para realizar las adquisiciones de Bines y Equipos de larga duración considerados en el grupo 84; sírvase presentar los informes técnicos justificativos y detallando las especificaciones técnica y el presupuesto referencial.</p> <p>2.- Con oficio N° 2014-050-GPR-HQPN, se remite a la Dirección Nacional de Salud de Policía Nacional el Informe Técnico Justificativo detallado las especificaciones técnicas y presupuesto referencial de bienes y equipos de larga duración considerados en el Grupo 84.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	06/08/2014 - 08:37 AM
<p>JUNIO 2014</p> <p>1.- Informe elaborado sobre requerimiento de mobiliario y equipos de la partida 84. A fin de gestionar autorización del Gasto ante el Ministerio del Interior</p> <p>2. La DNS está próxima a realizar la entrega de las instalaciones del edificio de la Consulta Externa por lo que este proyecto será descongelado para la consecución del mismo.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	04/07/2014 - 07:51 PM
<p>MAYO 2014</p> <p>1.- Se realiza revisión ejecutiva del proyecto por los administradores de la Herramienta GPR y en espera de la autorización del gasto de la Partida 84 correspondiente a Mobiliario y Equipo por el Ministerio del Interior.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	05/06/2014 - 12:42 PM
<p>ABRIL 2014:</p> <p>1.- Se realiza revisión ejecutiva del proyecto por el equipo metodológico.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	05/06/2014 - 12:40 PM
<p>MARZO 2014:</p> <p>1.- Se realiza revisión ejecutiva del proyecto por el equipo metodológico.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	10/04/2014 - 03:20 PM
<p>FEBRERO 2014.-</p> <p>1.- Se congela el proyecto hasta que se entregue el edificio de la Nueva Consulta Externa.</p> <p>2.- Con oficio s/n de fecha 13 de febrero suscrito por Ab. Klever Parrales Representante Legal de VIAPROYECTOS S.A. quien solicita una reunión con las personas responsables de supervisar la instalación del mobiliario para la Nueva Consulta Externa, a fin de cumplir con las cláusulas del contrato.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	06/03/2014 - 10:40 AM
<p>ENERO-29-2013.- Mediante oficio No.20143-0029-DI-DNS-PN suscrito por el Sr. Cap. de Policía Ing. Edwin Vique Benítez, Jefe del Dpto. de Infraestructuras de la DNS. Informa que se realizó el Acta de entrega recepción provisional del Edificio Para la Consulta Externa, detallándose observaciones Técnicas Constructivas que serán corregidas por el contratista. Razón por la cual se realizarán trabajos complementarios para el optimo funcionamiento de la Consulta Externa. EN TAL VIRTUD SE PROCEDE A CONGELAR EL PROYECTO Y SE ACUERDA CON LAS EMPRESAS CONTRATADAS EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO HASTA CUANDO SE REALICE LA RECEPCIÓN FÍSICA DEL EDIFICIO.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	04/02/2014 - 03:50 PM
<p>ENERO-29-2013.- Mediante oficio No.20143-0029-DI-DNS-PN suscrito por el Sr. Cap. de Policía Ing. Edwin Vique Benítez, Jefe del Dpto. de Infraestructuras de la DNS. Informa que se realizó el Acta de entrega recepción provisional del Edificio Para la Consulta Externa, detallándose observaciones Técnicas Constructivas que serán corregidas por el contratista. Razón por la cual se realizarán trabajos complementarios para el optimo funcionamiento de la Consulta Externa. EN TAL VIRTUD SE PROCEDE A CONGELAR EL PROYECTO Y SE ACUERDA CON LAS EMPRESAS CONTRATADAS EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO HASTA CUANDO SE REALICE LA RECEPCIÓN FÍSICA DEL EDIFICIO.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	04/02/2014 - 03:30 PM
<p>DICIEMBRE-05-2013.- Con oficio No. 2013-934-P4-HQPN suscrito por el Sr. SgtoP. Ing. Alfonso Paredes, Jefe de Logística solicita que se realicen los trámites correspondiente para solicitar autorización ante la Dirección Nacional de Salud a fin de que las empresas contratadas procedan a la instalación de los bienes Adquiridos.</p>	Contreras Andrade, Ronald Neptalí	06/01/2014 - 08:10 AM
<p>NOVIEMBRE-07-2013.- Con planilla de pago No. 14894 se procede a la cancelación del 50 % del valor del contrato No. 2013-118-AJ-HQPN por concepto de anticipo al contrato</p>	Contreras Andrade, Ronald Neptalí	03/12/2013 - 07:27 AM
<p>OCTUBRE-29-2013.- Se procede al firmar el contrato con la Empresa VIAPROYECTOS para la adquisición e instalación de mobiliario para la Nueva Consulta Externa del Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacional, por un valor de 1'435.381.05 dólares. Se Nombra como Administrador de contrato a los Srs. SgtoP. de Policía Ing. Alfonso Paredes y al Sr. SgtoS. de Policía Marcelo</p>	Contreras Andrade, Ronald Neptalí	13/11/2013 - 02:58 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mallitasig, Técnicos del Servicio de Mantenimiento, Quienes harán seguimiento y velarán por el cumplimiento del mismo.		
OCTUBRE-28-2013.- Mediante resolución No. 2013-977-DHQ-PN de Adjudicación SIE-HQPN-DA-078-2013 resuelve adjudicar a la empresa VIAPROYECTOS S.A. considerando la negociación con el 10 % de descuento del costo total. OCTUBRE-07-2013.- Mediante Informe Técnico elevado al Sr. TCnel de policía Dr. Ronald Contreras Director Administrativo, la comisión emite calificación de ofertas del proceso de Subasta Inversa Electrónica signado con el código No.SIE-HQPN-DA-078-2013 para la adquisición de Mobiliario para la Nueva Consulta Externa	Contreras Andrade, Ronald Neptalí	13/11/2013 - 02:32 PM
SEPTIEMBRE-25-2013.- Mediante resolución No.2013-904-DHQ-PN eL Sr. TCnel. Dr. Ronal Contreras en calidad de Director Administrativo del Hospital Quito No.1 de PN resuelve aprobar la convocatoria y pliegos para la Adquisición de mobiliario para la Nueva Consulta Externa. SEPTIEMBRE-11-2013.- Mediante resolución de reforma al PAC No. 2013-850-DHQ-PN el Sr. Tcnel Dr. Galo Madera Silva en calidad de Director Administrativo del Hospital Quito No.1 de PN Acc. Reformar reformar e incluir en el PAC 2013 La adquisición de los equipos y muebles para el nuevo edificio de la Consulta Externa. SEPTIEMBRE-05-2013.-Mediante oficio No. 2013-1153-JF-HQPN suscrito por la Sra. Mayor de Policía Ing. Com. Flor Cabrera Jefe Financiero indica que existe disponibilidad presupuestaria en la partida de: Maquinaria y Equipos, Mobiliario, Equipos y paquetes informáticos, Instrumental médico menor, Maquinaria y equipos no depreciable, Repuestos y accesorios, Mantenimiento de áreas verdes.	Contreras Andrade, Ronald Neptalí	13/11/2013 - 02:19 PM
JUNIO-27-2013.- Con oficio No. 2013-040-CE-HQPN suscrito por las Lcdas. Wilma Alvear, Jefe de enfermeras, Lic. Margoth Urco, Coordinadora de UCI y la Lic. Alexi Salgado Coordinadora de la Consulta Externa presentan la Creación de la Necesidad para el equipamiento e instalación de mobiliario para la Nueva Consulta Externa.	Contreras Andrade, Ronald Neptalí	13/11/2013 - 01:30 PM

Problemas cerrados: 1

Riesgos cerrados: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN Acta de constitución firmada	1-Solicitud de Información	27/06/2013		27/06/2013		Sí	3.0
2	DEFINICIÓN Necesidad creada por la Sra. Jefe de Enfermeras	1-Solicitud de Información	27/06/2013		27/06/2013		Sí	4.0
3	DEFINICIÓN Disponibilidad presupuestaria aprobada	1-Solicitud de Información	05/09/2013		05/09/2013		Sí	3.0
4	PLANIFICACIÓN Resolución de reforma al PAC aprobada	1-Solicitud de Información	12/09/2013		12/09/2013		Sí	3.0
5	PLANIFICACIÓN Pliegos aprobados y publicados	2-Publicación de Pliegos	25/09/2013		25/09/2013		Sí	3.0
6	PLANIFICACIÓN Proceso adjudicado a la empresa VIAPROYECTOS	3-Adjudicación	28/10/2013		28/10/2013		Sí	4.0
7	EJECUCIÓN Contrato firmado con la empresa VIAPROYECTOS	4-Inicio de Trabajo	29/10/2013		29/10/2013		Sí	8.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	EJECUCIÓN Anticipo entregado por el 50% del valor del contrato	5-Entregables Intermedios	07/11/2013		07/11/2013		Sí	8.0
9	EJECUCIÓN Solicitud presentada ante el Sr. Director del Hospital a fin de gestionar autorización de la DNS para proceder a la instalación de mobiliario	1-Solicitud de Información	05/12/2013		05/12/2013		Sí	8.0
10	EJECUCIÓN según informe emitido por Sr. Cap. Edwin Bique Benítez indica que se realizará trabajos complementarios de acuerdo a informes emitidos por Cuerpo de bomberos y la Unidad técnica de Control de Construcciones de Quito.	1-Solicitud de Información	29/01/2014		29/01/2014		Sí	8.0
11	EJECUCIÓN: Proyecto congelado hasta que el edificio sea entregado por la DNS	V - Verificación ejecutiva	04/02/2014		04/02/2014		Sí	6.0
12	EJECUCIÓN Solicitud presentada por la empresa para reunión con los responsables de la supervisar la instalación de la Nueva Consulta Externa.	1-Solicitud de Información	13/02/2014		13/02/2014		Sí	6.0
13	EJECUCIÓN: Revisión ejecutiva del proyecto realizada por el equipo metodológico.	1-Solicitud de Información	31/03/2014		31/03/2014		Sí	6.0
14	EJECUCIÓN: Revisión ejecutiva del proyecto realizada por el equipo metodológico.	1-Solicitud de Información	30/06/2014		30/06/2014		Sí	7.0
15	EJECUCIÓN: Comisión conformada para la recepción del Nuevo edificio de Consulta Externa	5-Entregables Intermedios	28/08/2014		28/08/2014		Sí	5.0
16	EJECUCIÓN: Informe presentado por el Sr. Ing. Alfonso Paredes, Administrador del contrato para la Adquisición de Mobiliario para la Nueva Consulta Externa.	1-Solicitud de Información	04/12/2014		04/12/2014		Sí	4.0
17	EJECUCIÓN: Acta de entrega - recepción firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	10/12/2014		10/12/2014		Sí	4.0
18	EJECUCIÓN: Proyecto congelado por autorización del Sr. Director del Hospital	1-Solicitud de Información	07/01/2015		07/01/2015		Sí	0.0
19	CIERRE:Informe final elaborado	V - Verificación ejecutiva	25/02/2015	25/02/2015			No	5.0
20	CIERRE: Contrato Liquidado	9-Entregables Formales	27/02/2015	27/02/2015			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	717,690.52 **
Costo Total:	1,435,381.05
Total Devengado:	717,690.52
% Costo Total Devengado:	50.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 50.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,435,381.05	0.00	0.00	1,435,381.05
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,435,381.05	0.00	0.00	1,435,381.05
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	1,435,381.05	0.00	0.00	1,435,381.05
Ppto. Devengado	717,690.52	0.00	0.00	717,690.52
Estimado a fin de año	* 717,690.52	0.00	0.00	717,690.52
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	717,690.53	0.00	0.00	717,690.53
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 50.00 %	0.00 %	0.00 %	50.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

9	Incrementar la satisfacción de los usuarios en los Servicios de Salud MEDIANTE convenios con la red complementaria, la remodelación de la infraestructura, adquisición de tecnología médica de punta, capacitación al talento humano, e implementación de las TICs, y aplicación de encuestas periódicas a los usuarios, gestionar el incremento de médicos especialistas.
10	Incrementar el uso óptimo del presupuesto MEDIANTE una adecuada gestión, planificación, ejecución y monitoreo del presupuesto asignado para el aprovisionamiento de insumos medicinas, mobiliario y mantenimiento de equipos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 1.- ACTA DE CONSTITUCION	A_1..PDF	05/12/2013
2	ASOCIACION HITO 9.- AUTORIZACIÓN ANTE LA DNS PARA INSTALACIÓN	A_9.pdf	24/06/2014
3	ASOCIACIÓN HITO 10.- Respuesta emitida por la Dirección Nacional de Salud PN	B_1.pdf	30/01/2014
4	ASOCIACIÓN HITO 11.- Proyectos congelados autorizados por el señor Director del Hospital Quito.	B_2.PDF	25/07/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
5	ASOCIACIÓN HITO 15.- Comisión conformada para recepción de la Nueva Consulta Externa	B_6.pdf	17/09/2014
6	ASOCIACIÓN HITO 18.- Autorización proyecto congelado Extensión plazo	B_18.pdf	10/02/2015
7	ASOCIACIÓN HITO 2.- CREACIÓN DE LA NECESIDAD	A_2.pdf	02/12/2013
8	ASOCIACIÓN HITO 3.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A_3.pdf	02/12/2013
9	ASOCIACIÓN HITO 4.- RESOLUCIÓN DE REFORMA AL PAC	A_4.pdf	02/12/2013
10	ASOCIACIÓN HITO 5.- APROBACION Y CONVOCATORIA DE PLIEGOS	A_5.PDF	02/12/2013
11	ASOCIACIÓN HITO 6.- OFERTAS CALIFICADAS	A_6.PDF	02/12/2013
12	ASOCIACIÓN HITO 7.- PROCESO ADJUDICADO A LA EMPRESA VIAPROYECTOS	A_7.PDF	02/12/2013
13	ASOCIACIÓN HITO 8. Contrato firmado con la empresa VIAPROYECTOS	A_8..PDF	28/01/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Echeverria Guerra, Carmen del Pilar	Coordinador Financiero
Mallitasig Ortega , Aníbal Marcelo	Lider Técnico
Paredes Vizcaino, Jose Alfonso	Lider del Proyecto
Proaño Paredes, Alfredo Fabian	Coordinador Administrativo
