

PN - Policía Nacional del Ecuador
Dirección Nacional de Salud
Hospital Guayaquil

PROYECTO: I010 Instalación de una nueva acometida eléctrica, para los equipos de climatización del hospital.

Líder del Proyecto:	Vargas Cañar, Franco (fvargas@hdpng2.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Villalba, Verónica Alexandra	Programas Relacionados:	
Titular:	Torres Arboleda, Carlos Fabián	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/01/2015 - 31/08/2015
Fecha de última actualización:	10/06/2015	Fecha de Fin Base:	20/08/2015
Modificado por:	Torres Arboleda, Carlos Fabián	Fecha del siguiente Hito:	29/06/2015

DATOS GENERALES

Descripción

Realizar una nueva acometida eléctrica para centralizar las cargas y mejorar el rendimiento del Breaker de 630 A/3P, que se encuentra en el tablero de distribución principal el mismo que fue diseñado para proteger la carga identificada como TPN 1-4 (cargas del primero al cuarto piso).

Beneficios Cualitativos

Acometida Eléctrica para los cuatros pisos del hospital.

Tipo de Beneficiario

INTERNO: Personal Medico, Personal Tecnico y Administrativo

EXTERNO: Usuarios de esta Casa de Salud.

Restricciones

TIEMPO: Que el Proyecto debe de terminar en el tiempo estipulado según cronograma.

COSTO: El valor del proyecto no debe sobrepasar el valor calculado en el cronograma valorado


ALCANCE: Se debe realizar el proyecto de acuerdo a lo establecido en los términos referenciales.

RESULTADOS: Instalación eléctrica para el funcionamiento de los aires acondicionados.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 73.22 %
 Fecha de Inicio: 05/01/2015 Fecha de Fin: 31/08/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

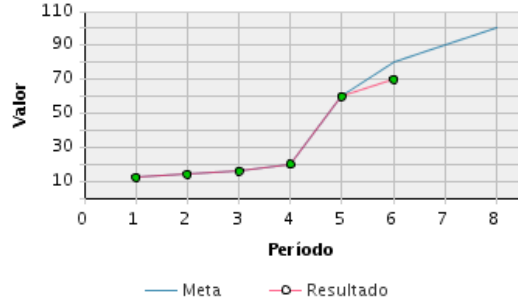

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	12 %	14 %	16 %	20 %	60 %	80 %	90 %	100 %				
	Avance real acumulado											
	12 %	14 %	16 %	20 %	60 %	70 %						
	Estado											
	●	●	●	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo 15: Se firma contrato No. 014-AJ-MINHPNG2-2-2015 (Hito relacionado 9)	Torres Arboleda, Carlos Fabián	08/06/2015 - 10:11 AM
Abril 28: La Empresa Adjudicataria presenta la Póliza de fiel cumplimiento. Abril 28: Se Cierra El Riesgo La no presentación de la poliza del buen uso del anticipo CAUSARÍA retraso en el proyecto Abril 27: Con memorando 5692-DA-HDPNG2, se dispone a Asesoría Jurídica mediante trámite legal pertinente, elabore el contrato respectivo. Abril 21: Se firma la respectiva Acta de Adjudicación No. 069-DCP-HPNG2-2015 (Hito relacionado 8) Abril 15: 11H00 La Comisión Técnica legaliza el Acta de Calificación No. SIE-HPNG2-03-2015 Abril 10: 17H00 se realiza la apertura de sobre en conjunto con la Comisión Técnica asignada para el proceso. Abril 10: Con oficio No. 307-DCP-HDPNG2, Se me entrega una oferta técnica referente al proceso SIE-HPNG2-013-2015. Abril 07: Con memorando No. 4709-DCP-HDPNG2, se me nombra para conformar la Comisión Técnica para la calificación de ofertas Abril 07: Se Publica el respectivo proyecto en el portal de compras publicas, procesos precontractuales (Hito relacionado 7)	Torres Arboleda, Carlos Fabián	06/05/2015 - 08:20 AM
Marzo 30: Se reestructurarán los hitos Marzo 27: Se procede a cerrar el riesgo La Falta de asignación presupuestaria CAUSARÍA que no se ejecuten el proyecto el mismo que fue mitigado Marzo 20: Se procede a cerrar la acción Se debe insistir ante el Ministerio de Finanzas para que asigne el presupuesto necesario para poder iniciar el proyecto el mismo que fue mitigado Marzo 18: Se declara desierta el proceso por la razón que ningún proveedor presenta interés en participar (Hito relacionado 6) Marzo 05: Se eleva al portal de compras publicas el respectivo proyecto (Hito relacionado 6)	Torres Arboleda, Carlos Fabián	06/04/2015 - 09:57 AM
Febrero 20: Se procede a dar inicio al análisis de pliegos para la contratación y subida al portal de Compras Publicas. (Hito relacionado 5) Febrero 06 .- Se dispone elaborar la resolución motivada mediante memorando No. 2183-DA-HDPNG2 (Hito relacionado 4)	Torres Arboleda, Carlos Fabián	06/03/2015 - 10:19 AM
Enero 22 .- Se desarrolla el Plan del Proyecto (Hito relacionado 3). Enero 15.- Se aprueba el ACTA DE CONSTITUCION del proyecto (Hito relacionado 2). Enero 08.- Se llama a reunion para la elaboración del Acta de Constitución. (Acta de Reunion No.001). Enero 05.- Se recibe por parte de la DIRPLAN la aprobación del proyecto (Hito relacionado 1).	Torres Arboleda, Carlos Fabián	05/02/2015 - 04:54 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	5- PROYECTO. * General. El poco compromiso en la realización del contrato por parte de Asesoría Jurídica CAUSARÍA retraso en la ejecución del mismo	05/05/2015	Franco Vargas Cañar	60 %	70	42	0/1

Riesgos cerrados: 2



LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Documento validado.	1-Solicitud de Información	05/01/2015		05/01/2015		Sí	0.0
2	DEFINICIÓN: Acta de Constitución aprobada.	1-Solicitud de Información	15/01/2015		15/01/2015		Sí	10.0
3	PLANIFICACIÓN: Plan del proyecto aprobado.	1-Solicitud de Información	22/01/2015		22/01/2015		Sí	2.0
4	PLANIFICACION: Resolución motivada para la contratación, aprobada	1-Solicitud de Información	06/02/2015		06/02/2015		Sí	1.0
5	PLANIFICACION: Analisis de pliegos para la contratación, iniciado	1-Solicitud de Información	20/02/2015		20/02/2015		Sí	1.0
6	PLANIFICACIÓN: Procesos pre contractuales, iniciado.	2-Publicación de Pliegos	05/03/2015		05/03/2015		Sí	2.0
7	PLANIFICACIÓN: Procesos precontractuales estructurados, iniciado	2-Publicación de Pliegos	07/04/2015		07/04/2015		Sí	2.0
8	PLANIFICACIÓN: Acta de adjudicación, aprobada	3-Adjudicación	21/04/2015		21/04/2015		Sí	2.0
9	PLANIFICACION: Procesos contractuales, terminado	3-Adjudicación	15/05/2015		15/05/2015		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Primer Anticipo, entregado	4-Inicio de Trabajo	20/05/2015		20/05/2015		Sí	38.0
11	EJECUCIÓN: Aceptación del Cronograma de Actividades, entregado	5-Entregables Intermedios	08/06/2015		08/06/2015		Sí	10.0
12	EJECUCIÓN: Entrega de tableros y materiales a Bodega General	5-Entregables Intermedios	29/06/2015	29/06/2015			No	10.0
13	EJECUCIÓN: Informe detallado del avance del proyectado, entregado	5-Entregables Intermedios	08/07/2015	08/07/2015			No	5.0
14	EJECUCIÓN: Informe detallado del avance del proyectado, entregado	5-Entregables Intermedios	24/07/2015	24/07/2015			No	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
15	CIERRE: Acta entrega recepción aprobada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	06/08/2015	06/08/2015			No	5.0
16	CIERRE: Informe final de la entrega obra realizada.	9-Entregables Formales	28/08/2015	28/08/2015			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

12	Incrementar la satisfacción de los usuarios en los Servicios de Salud MEDIANTE convenios con la red complementaria, la remodelación de la infraestructura, adquisición de tecnología médica de punta, capacitación al talento humano, e implementación de las TICs, y aplicación de encuestas periódicas a los usuarios, gestionar el incremento de médicos especialistas.
13	Incrementar el uso optimo del presupuesto MEDIANTE una adecuada gestión, planificación, ejecución y monitoreo del presupuesto asignado para el aprovisionamiento de insumos medicinas, mobiliario y mantenimiento de equipos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 10: Anticipo, pagado	B1.PDF	03/06/2015
2	ASOCIACION HITO 1: Validación del Proyecto DIRPLAN	A1.pdf	05/05/2015
3	ASOCIACION HITO 2: Acta Constitucion	A2.pdf	05/05/2015
4	ASOCIACION HITO 3: Plan proyecto	A3.pdf	05/05/2015
5	ASOCIACION HITO 4: Resolucion de Inicio	A4.PDF	05/05/2015
6	ASOCIACION HITO 5: Pliegos	A5.pdf	05/05/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
7	ASOCIACION HITO 6: Declaración desierta	A6.pdf	05/05/2015
8	ASOCIACION HITO 7: Resolucion de Inicio 07-04-2015	A7.pdf	05/05/2015
9	ASOCIACION HITO 8: Acta de Adjudicacion Acometida electrica	A8.pdf	05/05/2015
10	ASOCIACION HITO 9: Contrato de Acometida eléctrica, aprobado	A9.PDF	03/06/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Nieto Ronquillo, Edward	Líder Técnico
Torres Arboleda, Carlos Fabián	Patrocinador del Proyecto
Vargas Cañar, Franco	lider del Proyecto
Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón	Patrocinador Ejecutivo
Vinueza Espinoza, Gonzalo Manuel	Patrocinador Financiero

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
93100_1.jpg	29/04/2015
