

**PN - Policía Nacional del Ecuador**  
**Dirección Nacional de Bienestar Social**  
**Dirección Nacional de Bienestar Social**

**PROYECTO: I036** Mantenimiento preventivo del CILA (Centro Infantil Luceritos de Amor)

Líder del Proyecto:	Castro Cuji, Jaime Antonio (Ingjaimec_61@yahoo.com)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vinueza Vallejo, Victor Hugo	Programas Relacionados:	
Titular:	Vinueza Vallejo, Victor Hugo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	30/01/2015 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	04/03/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Castro Cuji, Jaime Antonio	Fecha del siguiente Hito:	12/03/2015

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: la DNBS buscando el bienestar del Miembro Policial y su Familia, ha visto la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo en el CIMI Guaranda, presenta deterioro de: enlucidos reventados, pintura reventada o ampollada, deterioro y dañados juegos infantiles, fuga de agua, otros.

PRODUCTO/SERVICIO: Mejor confort para el desarrollo de las actividades y mejorar la imagen Institucional.

LINEA BASE: Deterioro del 90% de: pintura exterior del Centro Infantil se encuentra deteriorado.

OBJETIVO GENERAL: Dar el mantenimiento preventivo al Centro Infantil Mundo de Ilusiones, con el fin de brindar un adecuado servicio y condiciones adecuadas a los niños hijos de los Policías

**OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

Mejorar las condiciones de confort del Centro.

Mejorar las instalaciones hidro-sanitarias del Centro infantil.

Evitar multas por parte de los GAD, por deterioro de la pintura exterior del Centro Infantil.

**Beneficios Cualitativos**

Apropiada funcionalidad del CILA.

Condiciones de confort adecuadas.

Imagen visual del entorno del Centro Infantil Luceritos de Amor mejorado.

**Tipo de Beneficiario**

INTERNO: Personal Policial y sus familias del DMQ.

EXTERNO: Ciudadanía.

**Restricciones**

TIEMPO: 12 meses

COSTO REFERENCIAL: 23.000 dólares.

ALCANCE: Mejorar la imagen visual del Centro Infantil y evitar inconvenientes por fugas de agua, para lo cual se realizará la pintura interior/exterior (satinada), rectificación de las fugas de agua, reparación y pintura en juegos infantiles, rectificación y relacado de puertas.


RECURSOS: Humano: Personal técnico (3) de la UEV-DNBS; Equipo y materiales de oficina: ( Computadora e impresora, papel bond, esferos, flexómetro laxer, cámara).

Recurso externo: contratación de una personal natural o empresa para la ejecución de los trabajos.

Fase Actual:	Anteproyecto	<b>Definición</b>	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	-------------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------


## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 16.67 %  
 Fecha de Inicio: 30/01/2015 Fecha de Fin: 31/12/2015

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

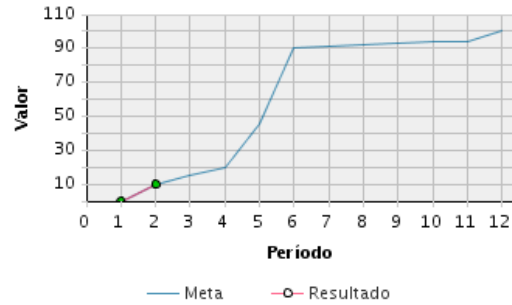

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	0 %	10 %	15 %	20 %	45 %	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	94 %	100 %
	Avance real acumulado											
	0 %	10 %										
Estado												
	●	●										

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2015: Se continua preparando el soporte técnico consistente en presupuesto, planos y especificaciones técnicas que serán entregados a mediados del mes próximo.	Castro Cuji, Jaime Antonio	04/03/2015 - 02:16 PM
ENERO 2015: Se realiza anteproyecto, se elabora acta de constitución del proyecto y inicia elaboración soporte técnico.	Castro Cuji, Jaime Antonio	04/02/2015 - 07:05 PM

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	<b>4- ORGANIZACIONAL. * General.</b> Falta de personal técnico en la Unidad Ejecutora de Vivienda de la DNBS-PN CAUSARÍA el retraso del Proyecto planificado.	04/03/2015	Diego Hernán Fernández Pilataxi	30 %	60	18	0/1

Riesgos cerrados: 0

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Documento de validación, terminado	1-Solicitud de Información	30/01/2015		30/01/2015	●	Sí	0.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	DEFINICIÓN: Acta de constitución del proyecto entregado.	1-Solicitud de Información	06/02/2015		06/02/2015		Sí	1.0
3	DEFINICIÓN: Diagnóstico terminado	1-Solicitud de Información	13/02/2015		13/02/2015		Sí	4.0
4	DEFINICIÓN: Levantamiento de información, realizada	5-Entregables Intermedios	20/02/2015		20/02/2015		Sí	5.0
5	PLANIFICACIÓN: Elaboración del soporte técnico, terminado.	5-Entregables Intermedios	12/03/2015	12/03/2015			No	2.5
6	PLANIFICACIÓN: Certificación presupuestaria, realizada.	5-Entregables Intermedios	20/03/2015	20/03/2015			No	2.5
7	PLANIFICACIÓN: Proceso de contratación, terminada.	2-Publicación de Pliegos	17/04/2015	17/04/2015			No	2.5
8	PLANIFICACIÓN: Contratación del proyecto, realizado	3-Adjudicación	27/04/2015	27/04/2015			No	2.5
9	EJECUCIÓN: Arranque de los trabajos, iniciado.	4-Inicio de Trabajo	04/05/2015	04/05/2015			No	5.0
10	EJECUCIÓN: Inspección de avance de obra, realizado	5-Entregables Intermedios	15/05/2015	15/05/2015			No	10.0
11	EJECUCIÓN: Inspección de avance de obra, realizado	5-Entregables Intermedios	29/05/2015	29/05/2015			No	10.0
12	EJECUCIÓN: Inspección de avance de obra, realizado	5-Entregables Intermedios	12/06/2015	12/06/2015			No	10.0
13	EJECUCIÓN: Final de obra, realizado.	5-Entregables Intermedios	19/06/2015	19/06/2015			No	10.0
14	EJECUCIÓN: Recepción de obra PROVISIONAL, realizada.	9-Entregables Formales	26/06/2015	26/06/2015			No	20.0
15	EJECUCIÓN: Inspección de obra, realizada	9-Entregables Formales	30/06/2015	30/06/2015			No	5.0
16	EJECUCIÓN: Inspección de obra, realizada	5-Entregables Intermedios	24/07/2015	24/07/2015			No	1.0
17	CIERRE: Inspección de Obra, realizada	5-Entregables Intermedios	21/08/2015	21/08/2015			No	1.0
18	CIERRE: Inspección de Obra, realizada	5-Entregables Intermedios	25/09/2015	25/09/2015			No	1.0
19	CIERRE: Inspección de Obra, realizada	5-Entregables Intermedios	23/10/2015	23/10/2015			No	1.0
20	CIERRE: Inspección de Obra, realizada	5-Entregables Intermedios	11/12/2015	11/12/2015			No	1.0
21	CIERRE: Recepción de obra DEFINITIVA, realizada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	18/12/2015	18/12/2015			No	4.0
22	CIERRE: Inspección de Obra, realizada	9-Entregables Formales	22/12/2015	22/12/2015			No	1.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

### Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

## OBJETIVOS ALINEADOS

### Objetivos Operativos

5	Incrementar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor policial y su familia MEDIANTE el equipamiento y mantenimiento de vivienda fiscal y centros de cuidado infantil, fomentar el desarrollo psicosocial del servidor policial y brindar el asesoramiento oportuno.
---	---

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Castro Cuji, Jaime Antonio	Lider Técnico
Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	Lider del Proyecto
Vasconez Castro, Paulina Raquel	Jefa Financiera
Vinueza Vallejo, Victor Hugo	Patrocinador Ejecutivo
