

**PN - Policía Nacional del Ecuador**  
**Dirección Nacional de Bienestar Social**  
**Dirección Nacional de Bienestar Social**

**PROYECTO: I033 Mantenimiento preventivo del CIMI Guaranda**

Líder del Proyecto:	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio (giov_i_rueda32@yahoo.com)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vinueza Vallejo, Victor Hugo	Programas Relacionados:	
Titular:	Vinueza Vallejo, Victor Hugo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	09/01/2015 - 20/12/2015
Fecha de última actualización:	02/04/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	Fecha del siguiente Hito:	17/04/2015

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: la DNBS buscando el bienestar del Miembro Policial y su Familia, ha visto la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo en el CIMI Guaranda, presenta deterioro de: enlucidos reventados, pintura reventada o ampollada, deterioro y dañados juegos infantiles, fuga de agua, otros.

PRODUCTO/SERVICIO: Mejor confort para el desarrollo de las actividades y mejorar la imagen Institucional.

LINEA BASE: Deterioro del 90% de: pintura exterior del Centro Infantil se encuentra deteriorado.

OBJETIVO GENERAL: Dar el mantenimiento preventivo al Centro Infantil Mundo de Ilusiones, con el fin de brindar un adecuado servicio y condiciones adecuadas a los niños hijos de los Policías

**OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

Mejorar las condiciones de confort del Centro.

Mejorar las instalaciones hidro-sanitarias del Centro infantil.

Evitar multas por parte de los GAD, por deterioro de la pintura exterior del Centro Infantil.

**Beneficios Cualitativos**

Apropiada funcionalidad del CIMI Guaranda.

Condiciones de confort adecuadas.

Imagen visual del entorno del CIMI Guaranda mejorado.

**Tipo de Beneficiario**

INTERNO: Personal Policial y sus familias de la Sub Zona Chimborazo.

EXTERNO: Ciudadanía.

**Restricciones**

TIEMPO: 12 meses

COSTO REFERENCIAL: 15.000 dólares.

ALCANCE: Mejorar la imagen visual del Centro Infantil y evitar inconvenientes por fugas de agua, para lo cual se realizará la pintura exterior (satinada), rectificación de las fugas de agua, reparación y pintura en juegos infantiles, rectificación y relacado de puertas.


RECURSOS: Humano: Personal técnico (3) de la UEV-DNBS; Equipo y materiales de oficina: ( Computadora e impresora, papel bond, esferos, flexómetro laxer, cámara).

Recurso externo: contratación de una personal natural o empresa para la ejecución de los trabajos.

Fase Actual:	Anteproyecto	<b>Definición</b>	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	-------------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 32.95 %  
 Fecha de Inicio: 09/01/2015 Fecha de Fin: 20/12/2015

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

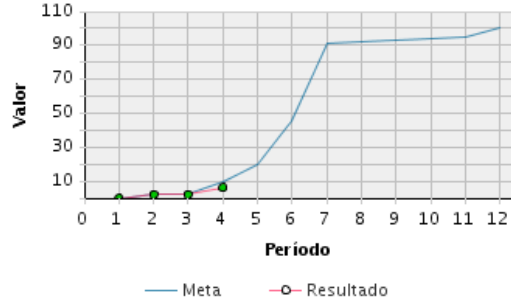

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	0 %	2 %	2 %	10 %	20 %	45 %	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %	100 %
	Avance real acumulado											
	0 %	2 %	2 %	6 %								
	Estado											
	●	●	●	●								

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los trabajos de Mantenimiento preventivo y correctivo del CIMI-GUARANDA	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	02/04/2015 - 05:07 PM
ABRIL 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los trabajos de Mantenimiento preventivo y correctivo del CIMI-GUARANDA	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	02/04/2015 - 04:37 PM
FEBRERO 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los trabajos de Mantenimiento preventivo y correctivo del CIMI-GUARANDA	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	04/03/2015 - 05:19 PM
ENERO 2015: Se prepara la documentación técnica para la contratación de los trabajos.	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	28/01/2015 - 10:20 AM

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	<b>5- PROYECTO. * General.</b> Falta de personal técnico en la Unidad Ejecutora de Vivienda de la DNBS-PN CAUSARÍA el retraso del Proyecto planificado	04/03/2015	Giovanni Patricio Rueda Tabarez	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 0

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Documento de validación, terminado	1-Solicitud de Información	16/02/2015		16/02/2015		Sí	1.0
2	DEFINICIÓN: Constitución del proyecto.	4-Inicio de Trabajo	20/02/2015		20/02/2015		Sí	1.0
3	DEFINICIÓN: Diagnóstico terminado	5-Entregables Intermedios	02/04/2015		02/04/2015		Sí	4.0
4	DEFINICIÓN: Levantamiento de información, realizada	5-Entregables Intermedios	17/04/2015	17/04/2015			No	4.0
5	PLANIFICACIÓN: Elaboración del soporte técnico, terminado.	5-Entregables Intermedios	01/05/2015	01/05/2015			No	2.5
6	PLANIFICACIÓN: Certificación presupuestaria, realizada.	5-Entregables Intermedios	08/05/2015	08/05/2015			No	2.5
7	PLANIFICACIÓN: Proceso de contratación, terminada.	9-Entregables Formales	22/05/2015	22/05/2015			No	2.5
8	PLANIFICACIÓN: Contratación del proyecto, realizado	5-Entregables Intermedios	29/05/2015	29/05/2015			No	2.5
9	EJECUCIÓN: Arranque de los trabajos, iniciado.	5-Entregables Intermedios	01/06/2015	01/06/2015			No	5.0
10	EJECUCIÓN: Inspección de avance de obra, realizado.	5-Entregables Intermedios	12/06/2015	12/06/2015			No	10.0
11	EJECUCIÓN: Inspección de avance obra, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015	30/06/2015			No	10.0
12	EJECUCIÓN: Inspección de avance de obra, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/07/2015	10/07/2015			No	10.0
13	EJECUCIÓN: Final de obra, realizado.	5-Entregables Intermedios	17/07/2015	17/07/2015			No	10.0
14	EJECUCIÓN: Recepción de obra PROVISIONAL, realizada.	9-Entregables Formales	24/07/2015	24/07/2015			No	20.0
15	EJECUCIÓN: Inspección de obra, realizada	1-Solicitud de Información	27/07/2015	27/07/2015			No	5.0
16	CIERRE: Inspección de Obra, realizada	1-Solicitud de Información	31/07/2015	31/07/2015			No	1.0
17	CIERRE: Inspección de Obra, realizada	1-Solicitud de Información	21/08/2015	21/08/2015			No	1.0
18	CIERRE: Inspección de Obra, realizada	5-Entregables Intermedios	18/09/2015	18/09/2015			No	1.0
19	CIERRE: Inspección de Obra, realizada	5-Entregables Intermedios	23/10/2015	23/10/2015			No	1.0
20	CIERRE: Inspección de Obra, realizada	2-Publicación de Pliegos	27/11/2015	27/11/2015			No	1.0
21	CIERRE: Recepción de obra DEFINITIVA, realizada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	11/12/2015	11/12/2015			No	4.0
22	CIERRE: Inspección de Obra, realizada	9-Entregables Formales	15/12/2015	15/12/2015			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 0.00 %

**Perfil Económico 2015**

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

**OBJETIVOS ALINEADOS**

**Objetivos Operativos**

5	Incrementar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor policial y su familia MEDIANTE el equipamiento y mantenimiento de vivienda fiscal y centros de cuidado infantil, fomentar el desarrollo psicosocial del servidor policial y brindar el asesoramiento oportuno.
---	---

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 2: Acta de constitución	Acta_constitucion.pdf	02/04/2015

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol
Fernández Pilataxi, Diego Hernán	Líder Técnico
Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	Líder del Proyecto
Vasconez Castro, Paulina Raquel	Coordinador Financiero
