

PN - Policía Nacional del Ecuador
Dirección Nacional de Bienestar Social
Dirección Nacional de Bienestar Social

PROYECTO: I033 Mantenimiento preventivo del CIMI Guaranda

Líder del Proyecto:	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio (giov_i_rueda32@yahoo.com)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rosero Erazo, Myrian Elena	Programas Relacionados:	
Titular:	Rosero Erazo, Myrian Elena	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	09/01/2015 - 18/12/2015
Fecha de última actualización:	05/08/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	Fecha del siguiente Hito:	14/08/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: la DNBS buscando el bienestar del Miembro Policial y su Familia, ha visto la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo en el CIMI Guaranda, presenta deterioro de: enlucidos reventados, pintura reventada o ampollada, deterioro y dañados juegos infantiles, fuga de agua, otros.

PRODUCTO/SERVICIO: Mejor confort para el desarrollo de las actividades y mejorar la imagen Institucional.

LINEA BASE: Deterioro del 90% de: pintura exterior del Centro Infantil se encuentra deteriorado.

OBJETIVO GENERAL: Dar el mantenimiento preventivo al Centro Infantil Mundo de Ilusiones, con el fin de brindar un adecuado servicio y condiciones adecuadas a los niños hijos de los Policías

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Mejorar las condiciones de confort del Centro.

Mejorar las instalaciones hidro-sanitarias del Centro infantil.

Evitar multas por parte de los GAD, por deterioro de la pintura exterior del Centro Infantil.

Beneficios Cualitativos

Apropiada funcionalidad del CIMI Guaranda.

Condiciones de confort adecuadas.

Imagen visual del entorno del CIMI Guaranda mejorado.

Tipo de Beneficiario

INTERNO: Personal Policial y sus familias de la Sub Zona Chimborazo.

EXTERNO: Ciudadanía.

Restricciones

TIEMPO: 12 meses

COSTO REFERENCIAL: 15.000 dólares.

ALCANCE: Mejorar la imagen visual del Centro Infantil y evitar inconvenientes por fugas de agua, para lo cual se realizará la pintura exterior (satinada), rectificación de las fugas de agua, reparación y pintura en juegos infantiles, rectificación y relacado de puertas.


RECURSOS: Humano: Personal técnico (3) de la UEV-DNBS; Equipo y materiales de oficina: (Computadora e impresora, papel bond, esferos, flexómetro laxer, cámara).

Recurso externo: contratación de una personal natural o empresa para la ejecución de los trabajos.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	-------------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 69.19 %
Fecha de Inicio: 09/01/2015 **Fecha de Fin:** 18/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

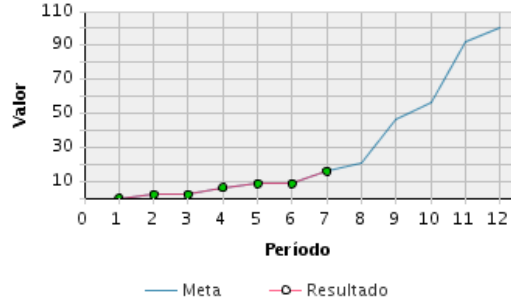

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	0 %	2 %	2 %	6 %	8 %	8 %	16 %	21 %	46 %	56 %	92 %	100 %
	Avance real acumulado											
	0 %	2 %	2 %	6 %	8 %	8 %	16 %					
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●					

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2015: Se presentó el soporte técnico para la contratación de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del CIMI-GUARANDAA y se solicitó certificación presupuestaria.	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	05/08/2015 - 03:29 PM
JUNIO 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los trabajos de Mantenimiento preventivo y correctivo del CIMI-GUARANDA	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	14/07/2015 - 10:25 AM
MAYO 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los trabajos de Mantenimiento preventivo y correctivo del CIMI-GUARANDA	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	05/06/2015 - 10:26 AM
ABRIL 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los trabajos de Mantenimiento preventivo y correctivo del CIMI-GUARANDA	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	05/05/2015 - 05:49 PM
MARZO 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los trabajos de Mantenimiento preventivo y correctivo del CIMI-GUARANDA	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	02/04/2015 - 05:07 PM
ABRIL 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los trabajos de Mantenimiento preventivo y correctivo del CIMI-GUARANDA	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	02/04/2015 - 04:37 PM
FEBRERO 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los trabajos de Mantenimiento preventivo y correctivo del CIMI-GUARANDA	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	04/03/2015 - 05:19 PM
ENERO 2015: Se prepara la documentación técnica para la contratación de los trabajos.	Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	28/01/2015 - 10:20 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. Que personal técnico sea dado el pase otra unidad CAUSARIA retraso en la presentación del Soporte Técnico	05/08/2015	Giovanni Patricio Rueda Tabarez	10 %	10	1	1/2

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Documento de validación, terminado	1-Solicitud de Información	16/02/2015		16/02/2015		Sí	1.0
2	DEFINICIÓN: Constitución del proyecto.	4-Inicio de Trabajo	20/02/2015		20/02/2015		Sí	1.0
3	DEFINICIÓN: Diagnóstico terminado	5-Entregables Intermedios	02/04/2015		02/04/2015		Sí	4.0
4	DEFINICIÓN: Levantamiento de información, realizada	5-Entregables Intermedios	10/05/2015		10/05/2015		Sí	2.5
5	PLANEACIÓN: Elaboración del soporte técnico, terminado.	5-Entregables Intermedios	29/07/2015		29/07/2015		Sí	2.5
6	PLANEACIÓN: Certificación presupuestaria, realizada	5-Entregables Intermedios	30/07/2015		30/07/2015		Sí	5.0
7	PLANEACIÓN: Proceso de contratación, terminada.	9-Entregables Formales	14/08/2015	14/08/2015			No	2.5
8	PLANEACIÓN: Contratación del proyecto, realizado	5-Entregables Intermedios	21/08/2015	21/08/2015			No	2.5
9	EJECUCIÓN: Arranque de los trabajos, iniciado.	5-Entregables Intermedios	04/09/2015	04/09/2015			No	5.0
10	EJECUCIÓN: Inspección de avance de obra, realizado.	5-Entregables Intermedios	11/09/2015	11/09/2015			No	10.0
11	EJECUCIÓN: Inspección de avance obra, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015	30/09/2015			No	10.0
12	EJECUCIÓN: Final de obra, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2015	30/10/2015			No	10.0
13	EJECUCIÓN: Inspección de avance de obra, realizado.	5-Entregables Intermedios	06/11/2015	06/11/2015			No	10.0
14	EJECUCIÓN: Recepción PROVISIONAL de obra, realizada.	9-Entregables Formales	13/11/2015	13/11/2015			No	20.0
15	EJECUCIÓN: Inspección de obra, realizada	1-Solicitud de Información	20/11/2015	20/11/2015			No	5.0
16	CIERRE: Inspección de Obra, realizada	1-Solicitud de Información	27/11/2015	27/11/2015			No	1.0
17	CIERRE: Inspección de Obra, realizada	1-Solicitud de Información	01/12/2015	01/12/2015			No	1.0
18	CIERRE: Inspección de Obra, realizada	5-Entregables Intermedios	08/12/2015	08/12/2015			No	1.0
19	CIERRE: Inspección de Obra, realizada	5-Entregables Intermedios	15/12/2015	15/12/2015			No	1.0
20	CIERRE: Recepción de obra DEFINITIVA, realizada.	9-Entregables Formales	18/12/2015	18/12/2015			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

- | | |
|---|---|
| 5 | Incrementar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor policial y su familia MEDIANTE el equipamiento y mantenimiento de vivienda fiscal y centros de cuidado infantil, fomentar el desarrollo psicosocial del servidor policial y brindar el asesoramiento oportuno. |
|---|---|

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 2: Acta de constitución	Acta_constitucion.pdf	02/04/2015
2	ASOCIACIÓN ACCION RIESGO: Falta de personal técnico en la Unidad Ejecutora de Vivienda de la DNBS-PN CAUSARÍA el retraso del Proyecto planificado	Oficio_034_UEV_DNBS_solicitando_personal_técnico.pdf	06/05/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Fernández Pilataxi, Diego Hernán	Líder Técnico	Lider de Proyecto DNBS	hernan-f@hotmail.com

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Rueda Tabarez, Giovanni Patricio	Líder del Proyecto	Técnico de la U .E.V	giovanni_rueda32@yahoo.com
Vasconez Castro, Paulina Raquel	Coordinador Financiero	Jefe Financiera DNBS	dnbs.jefaturafinanciera@policaecuador.gob.ec
