

PN - Policía Nacional del Ecuador
Dirección Nacional de Salud
Hospital Quito

PROYECTO: I043 Proyecto de aseo, limpieza y recolección de desechos del Hospital.

Líder del Proyecto:	Rubio Rivera, Maria Angelita (mariangelitar@hotmail.com)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón	Programas Relacionados:	
Titular:	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	Prioridad:	6
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	412,300.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	13/01/2014 - 20/04/2015
Fecha de última actualización:	02/04/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	Fecha del siguiente Hito:	06/04/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Adquisición de recipientes para almacenamiento de desechos peligrosos y no peligrosos generados en el HQN1.

PRODUCTO/SERVICIO: Además la contratación de una empresa que brinde servicios complementarios de limpieza ya que la institución no dispone de personal especializado en limpieza.

LÍNEA BASE: El servicio de aseo y limpieza debe incluir las áreas: internas y externas del hospital, así como áreas críticas, semicríticas y de ambulatorios.

OBJETIVO GENERAL: Adquirir recipientes para almacenamiento de desechos peligrosos y no peligrosos, generados en el hospital, así mismo, contratar una empresa de servicios de limpieza para las áreas críticas, semicríticas, no críticas, accesos, salas comunales, parqueaderos y edificio de la nueva Consulta Externa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1.- Almacenar adecuadamente los desechos peligrosos y no peligrosos generados en el hospital.

2.- Proporcionar un servicio que logre un óptimo estándar de limpieza apropiado para el uso de todas las instalaciones y espacios asistenciales.

3.- Llevar a cabo actuaciones eficaces en el menor tiempo cuando se detecte una situación que afecte a la disponibilidad o a la calidad del servicio.

Beneficios Cualitativos

Cumplir con la Normativa Sustitutiva de Manejo de Desechos Hospitalarios y así brindar la seguridad que el personal requiere, evitando infecciones cruzadas, intrahospitalarias con un manejo adecuado de los desechos, aplicados de acuerdo a la Normas de aseo y limpieza de desechos hospitalarios

Tipo de Beneficiario

USUARIO INTERNO: Son los beneficiarios del seguro del ISSPOL, pacientes que acuden en busca de atención diferentes áreas.

USUARIO EXTERNO: Pacientes que son referidos a través de referencia y contra referencia del Sistema Nacional de Salud.

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 1 año

COSTO: COSTO: El costo calculado para la realización del proyecto es de 645.000.00


ALCANCE: Que la empresa no se encuentre debidamente calificadas y normativas vigentes.

RECURSOS: Presupuesto insuficiente para dotar con lo requerido

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.98 %
 Fecha de Inicio: 13/01/2014 Fecha de Fin: 20/04/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

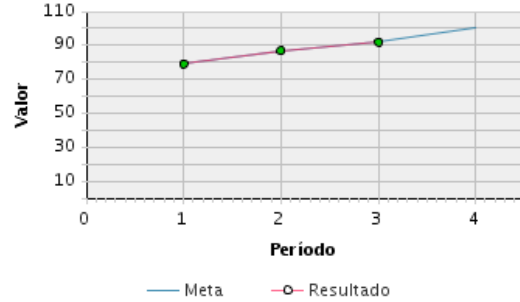

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	79 %	87 %	92 %	100 %								
	Avance real acumulado											
	79 %	87 %	92 %									
	Estado											
	●	●	●									

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2015..-</p> <p>1.- Mediante oficio No. 2015-009-SA-HQ-PN, suscrito por la Sra. SBOS. Lic. Angelita Rubio, Administradora de contrato remite Informe de los trabajos realizados por la Empresa HOSPICLEAN durante el periodo comprendido desde 1 al 28 de Febrero del 2015. ASOCIACIÓN HITO 33.</p> <p>2.- Con planilla No. 019403 de fecha 10 de marzo del 2015, se cancela a la empresa HOSPICLEAN S.A. LTDA. por servicios de limpieza hospitalaria correspondientes del 1 al 28 de febrero del 2015. ASOCIACIÓN HITO 34.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	02/04/2015 - 11:45 AM
<p>FEBRERO 2015:</p> <p>1.- Mediante Memorando N° 2015-098-DHQ-PN, suscrito por el señor Director Administrativo de esta Casa de Salud en el autoriza que se extienda el plazo de cierre del proyecto. ASOCIACIÓN AL HITO 29</p> <p>2.- Contrato Complementario firmado N° 2015-002-AJ-HQ-PN con la empresa HOSPICLEAN para la prestación del servicio de aseo y limpieza de las instalaciones interna y externas de esta Casa de Salud. ASOCIACIÓN AL HITO 30.</p> <p>3.- Mediante Oficio No. 2015-008-SA-HQ-PN, Suscrito por la Lic. Angelita Rubio remite informe de los trabajos realizados con la empresa HOSPICLEAN durante el período comprendido entre el 1 al 31 de enero del 2015. ASOCIACIÓN AL HITO 31</p> <p>4.- Con planilla No. 019231 de fecha 19 de febrero del 2015, se cancela a la empresa HOSPICLEAN S.A. LTDA. por servicios de limpieza hospitalaria correspondientes del 1 al 31 de enero del 2015. ASOCIACIÓN HITO 32.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	03/03/2015 - 04:04 PM
<p>ENERO 2015:</p> <p>1.- Mediante memorando No. 2015-098-DHQ-PN suscrito por el Sr. Director del Hospital Quito No.1 de fecha 12 de enero del 2015 se autoriza la prorroga del plazo de cierre en virtud de que no se ha cancelado la planilla de pago del mes de diciembre del 2014. ASOCIADO AL HITO 27</p> <p>2.- Mediante Oficio N° 2015-001-SA-HQ-PN, suscrito por la señora SboP. Lic. Angelita Rubio Administradora del Contrato, remite informe de las actividades realizadas por la empresa HOSPICLEAN en las instalaciones del Hospital Quito N° 1 correspondiente entre el 01 al 31 de diciembre del 2014. ASOCIACIÓN AL HITO 26</p> <p>3.- Con planilla de Pago No. 019073 de fecha 29 de enero se procede a cancelar a la empresa HOSPICLEAN por el servicio de aseo y limpieza correspondiente al mes de Diciembre. ASOCIACIÓN AL HITO 27</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	05/02/2015 - 03:50 PM
<p>DICIEMBRE 2014.-</p> <p>1. Mediante oficio No. 2014-113-SA-HQ-PN de fecha 4 de diciembre del 2014, suscrito por la Sra SOBS. de Policía Lic. Angelita Rubio, remite informe elaborado sobre las actividades de la</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	02/01/2015 - 11:55 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Empesa de Limpieza HOSPICLEAN desde el 01 al 30 de noviembre del 2014. ASOCIADO AL HITO 24. DICIEMBRE 2014.- 2.- Mediante planilla de pago No. 018712 de fecha 11 de diciembre se cancela por servicios de aseo y limpieza correspondiente al mes de noviembre a la Empresa HOSPICLEAN CIA. LTDA. ASOCIACIÓN AL HITO 25</p>		
<p>NOVIEMBRE 5 1.- Mediante off. No. 2014-102-SA-HQ-PN de fecha 5 de noviembre del 2014, suscrito por La Sra. Sbos. de Policía, Lic. Angelita Rubio, Administradora de contrato, dirigido al Sr. Director del Hospital se remite informe de las actividades realizadas por la empresa de limpieza HOSPICLEAN desde el 1 al 31 de Octubre del 2014. ASOCIADO AL HITO 22 2.- Mediante planilla de pago No. 018330 de fecha 20 de noviembre se cancela a la empresa HOSPICLEAN CIA LTDA. por los servicios prestados del 1 al 31 de Octubre del 2014. ASOCIADO AL HITO 23</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	05/12/2014 - 08:14 AM
<p>OCTUBRE 2014 1. Con planilla de pago No. 018034 del 17 de Octubre se procede a la cancelación por servicios de Limpieza Hospitalaria correspondiente al 01 al 30 de septiembre del 2014. ASOCIADO AL HITO 21</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	04/11/2014 - 03:11 PM
<p>SEPTIEMBRE 2014: 1.- Con oficio N° 2014-084-SA-HQ-PN, de fecha 03 de septiembre del 2014 suscrito por la señora Sbos. Lic. Angelita Rubio Administradora del Contrato, remite informe de actividades realizadas por la empresa HOSPICLEAN, correspondiente del 01 al 31 de agosto del 2014. 2.- Con planilla N° 00017696, se cancela a la empresa HOSPICLEAN S.A. LTDA. por servicios de limpieza hospitalaria correspondientes del 01 al 31 de agosto del 2014.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	03/10/2014 - 04:23 PM
<p>AGOSTO 2014: 1.- Mediante oficio N° 2014-079-SA-HQ-PN, suscrito por la señora Sbos. Lic. Angelita Rubio Administradora del contrato quien remite el informe mensual de las actividades realizadas por la empresa de aseo y limpieza HOSPICLEAN correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de julio del 2014. 2.- Con Planilla N° 00017264 se cancela a la empresa HOSPICLEAN CIA. LTDA. por los servicios de aseo y limpieza de las instalaciones de esta casa de salud correspondiente del 01 al 30 de julio del 2014.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	02/09/2014 - 10:14 AM
<p>JULIO 2014: 1.- Con planilla N° 00016693, se cancela a la empresa HOSPICLEAN por servicios de limpieza de las diferentes áreas hospitalarias correspondiente del 01 al 30 de mayo del 2014. 2.- Mediante oficio N° 2014-068-SA-HQ-PN, suscrito por la señora Sbos. Lic. Angelita Rubio Administradora del contrato quien remite el informe mensual de las actividades realizadas por la empresa de aseo y limpieza HOSPICLEAN correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2014. 3.- Con planilla N° 00017007 se cancela a la empresa HOSPICLEAN por servicios de limpieza de las diferentes áreas hospitalarias correspondiente del 01 al 30 de junio del 2014.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	05/08/2014 - 04:55 PM
<p>JUNIO 2014: 1.- Mediante oficio N° 2014-064-SA-HQ-PN suscrito por la señora Sbos. Lic. Angelita Tobar Administradora del Contrato, remite el informe de las actividades realizadas por la empresa de aseo y limpieza HOSPICLEAN del 01 al 30 de mayo del 2014.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	14/07/2014 - 09:20 AM
<p>MAYO 2014: 1.- Mediante un oficio N° 2014-062-SA-HQ-PN, suscrito por la señora Sbos. Lic. Angelita Rubio Administradora del Contrato, remite las actividades realizadas por la Empresa de Limpieza HOSPICLEAN comprendido entre el 30 de abril al 30 de mayo del 2014. 2.- Con Planilla N° 00016472 se cancela a la empresa HOSPICLEAN de las actividades realizadas de aseo y limpieza de esta casa de salud correspondiente del 11 al 30 de abril del 2014.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	05/06/2014 - 12:20 PM
<p>ABRIL 2014: 1.- Resolución de Adjudicatoria fallido N° 2014-001-DHQ-PN, En el que resuelven "ADJUDICATORIO FALLIDO" a la empresa DISTRIBUCIONES MIVA, por haber incurrido en el Art. 35 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 114 del Reglamento General a la misma. 2.- Resolución de Adjudicación a la segunda empresa oferente en Orden de prelación para la contratación de la Empresa de limpieza HOSPICLEAN CIA LTDA.</p>	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	05/05/2014 - 11:15 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3.- Contrato N° 2014-005-AJ-AJ-HQ-PN, firmado con la empresa HOSPICLEAN CIA. LTDA. para la prestación de servicios de limpieza para las instalaciones internas y externas del Hospital Quito N° 1.		
MARZO 2014.- 1.- Según resolución No.2014-189-DHQ-PN de Adjudicación del 14 de Marzo del 2014, se procede a adjudicar a la Empresa MIVA de la Sra. Valencia Anchudía Miriam Elizabeth, dentro del proceso de SIE-HQPN-DA-002-2014, para la contratación de una empresa que brinde el servicio de limpieza para las instalaciones internas y externas del Hospital Quito No.1 de la Policía Nacional	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	08/04/2014 - 10:59 AM
FEBRERO 2014: 1.- Con oficio N° 2014-0439-DHQ-PN, suscrito por el señor Director Administrativo del Hospital Quito N°1 el mismo que autoriza que se inicie el proceso para la contratación de una empresa que brinde el servicio de limpieza. 2.- Con oficio N° 2014-011-SA-HQ-PN, suscrito por la señora Sgop. Lic. Angelita Rubio Administradora del contrato, quien envía al señor Director Administrativo los terminos de referencia para la contratación de una empresa que brinde el servicio de limpieza. 3.- Mediante oficio N° 2014-0138-SP-HQ-PN, suscrito por la Sra. Econ. Susana Morales Jefe de Presupuesto del HQ, certifica disponibilidad presupuestaria en la partida 530209 Servicio de aseo vestimenta de trabajo fumigación y desinfección por el valor del \$441.000. 4.- Pliegos publicados mediante proceso de Subasta Inversa Electrónica. 5.- Remite el Dpto. de Compras Públicas el resumen de Puja .	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	06/03/2014 - 08:57 AM
ENERO 2014: 1. Mediante oficio No. 2013-118-SA-HQ-PN de fecha 16 de Diciembre suscrito por la Sr. Lic Angelita Rubio presenta proyecto para la Contratación de una Empresa de limpieza para las instalaciones internas y externas del Hospital Quito No.1 de la Policía Nacional incluido términos de referencia. (Hito cumplido 1) 2. Se elabora Acta de constitución de proyecto para la contratación de una empresa de limpieza con sus respectivos. (Hito cumplido 2)	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	05/02/2014 - 08:51 AM

Problemas cerrados: 3

Riesgos cerrados: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Elaboración del perfil del proyecto	1-Solicitud de Información	13/01/2014		13/01/2014		Sí	5.0
2	ANTEPROYECTO: Acta de Constitución firmada	1-Solicitud de Información	15/01/2014		15/01/2014		Sí	5.0
3	DEFINICIÓN: Disponibilidad presupuestaria certificada	1-Solicitud de Información	06/02/2014		06/02/2014		Sí	2.0
4	DEFINICIÓN: Pliegos publicados y aprobados	1-Solicitud de Información	12/02/2014		12/02/2014		Sí	2.0
5	DEFINICIÓN: Proceso de puja	2-Publicación de Pliegos	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.0
6	DEFINICIÓN: Empresa adjudicada	3-Adjudicación	14/03/2014		14/03/2014		Sí	2.0
7	DEFINICIÓN: Resolución Adjudicatorio fallido	4-Inicio de Trabajo	10/04/2014		10/04/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	DEFINICIÓN: Empresa adjudicada	1-Solicitud de Información	11/04/2014		11/04/2014		Sí	2.0
9	EJECUCIÓN: Contrato firmado con la empresa HOSPICLEAN CIA. LTDA.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	11/04/2014		11/04/2014		Sí	4.0
10	EJECUCIÓN: Informe presentado por el Sr. Administrador del Contrato del mes del 11 al 30 de abril del 2014	1-Solicitud de Información	12/05/2014		12/05/2014		Sí	4.0
11	EJECUCIÓN: Planilla pagada del 11 al 30 de Abril 2014	5-Entregables Intermedios	20/05/2014		20/05/2014		Sí	4.0
12	EJECUCIÓN: Informe presentado por el Sr. Administrador del Contrato del mes del 01 al 31 de Mayo del 2014	5-Entregables Intermedios	06/06/2014		06/06/2014		Sí	4.0
13	EJECUCIÓN: Planilla pagada del mes Mayo 2014	5-Entregables Intermedios	10/06/2014		10/06/2014		Sí	4.0
14	EJECUCIÓN: Informe presentado por el Administrador del Contrato del mes del 01 al 30 de Junio del 2014	1-Solicitud de Información	09/07/2014		09/07/2014		Sí	4.0
15	EJECUCIÓN: Planilla pagada del mes de Junio del 2014	5-Entregables Intermedios	16/07/2014		16/07/2014		Sí	4.0
16	EJECUCIÓN: Informe presentado por el Administrador del Contrato del mes del 01 al 31 de julio del 2014	1-Solicitud de Información	06/08/2014		06/08/2014		Sí	4.0
17	EJECUCIÓN: Planilla pagada del mes Julio 2014	5-Entregables Intermedios	19/08/2014		19/08/2014		Sí	4.0
18	EJECUCIÓN: Informe presentado por el Administrador del Contrato del mes del 01 al 31 de Agosto del 2014	1-Solicitud de Información	03/09/2014		03/09/2014		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Planilla pagada del mes Agosto 2014	5-Entregables Intermedios	16/09/2014		16/09/2014		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: Informe presentado por el Administrador del Contrato del mes del 01 al 30 de septiembre del 2014	1-Solicitud de Información	07/10/2014		07/10/2014		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: Planilla pagada del mes septiembre 2014	5-Entregables Intermedios	17/10/2014		17/10/2014		Sí	2.0
22	EJECUCIÓN: Informe presentado por el Administrador del Contrato del mes del 01 al 31 de octubre del 2014	1-Solicitud de Información	05/11/2014		05/11/2014		Sí	3.0
23	EJECUCIÓN: Planilla pagada del mes octubre 2014	5-Entregables Intermedios	20/11/2014		20/11/2014		Sí	3.0
24	EJECUCIÓN: Informe presentado por el Administrador del Contrato del mes del 01 al 30 de Noviembre del 2014	1-Solicitud de Información	04/12/2014		04/12/2014		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
25	EJECUCIÓN: Planilla pagada del mes Noviembre 2014	5-Entregables Intermedios	11/12/2014		11/12/2014		Sí	2.0
26	EJECUCIÓN: Informe presentado por el Administrador del Contrato del mes del 01 al 31 Diciembre del 2014	1-Solicitud de Información	08/01/2015		08/01/2015		Sí	2.0
27	EJECUCIÓN: Autorización aprobada extensión del plazo de cierre del contrato	5-Entregables Intermedios	12/01/2015		12/01/2015		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Planilla pagada del mes Diciembre 2014	5-Entregables Intermedios	29/01/2015		29/01/2015		Sí	2.0
29	EJECUCIÓN: Autorización remitida a Jurídico para ampliación del contrato con la empresa de limpieza	9-Entregables Formales	09/02/2015		09/02/2015		Sí	2.0
30	EJECUCIÓN: Contrato ampliatorio firmado con la Empresa HOSPICLEAN	9-Entregables Formales	10/02/2015		10/02/2015		Sí	2.0
31	EJECUCIÓN: Informe presentado por el Administrador del Contrato del mes del 01 al 31 enero del 2014	5-Entregables Intermedios	12/02/2015		12/02/2015		Sí	2.0
32	EJECUCIÓN: Planilla pagada del mes enero 2015	5-Entregables Intermedios	19/02/2015		19/02/2015		Sí	2.0
33	EJECUCIÓN: Informe presentado por el Administrador del Contrato del mes del 01 al 28 de febrero del 2014	5-Entregables Intermedios	06/03/2015		06/03/2015		Sí	2.0
34	EJECUCIÓN: Planilla pagada del mes febrero 2015	5-Entregables Intermedios	10/03/2015		10/03/2015		Sí	3.0
35	EJECUCIÓN: Informe presentado por el Administrador del Contrato del mes del 01 al 31 de marzo del 2014	5-Entregables Intermedios	06/04/2015	06/04/2015			No	3.0
36	CIERRE: Planilla pagada del mes marzo 2015 y liquidación del contrato.	5-Entregables Intermedios	10/04/2015	10/04/2015			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	412,300.00 **
Costo Total:	306,280.20
Total Devengado:	376,960.00
% Costo Total Devengado:	123.08 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 123.08 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	306,280.20	106,020.00	0.00	412,300.20
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	306,280.20	106,020.00	0.00	412,300.20
Ppto. Codificado	0.00	106,020.00	0.00	106,020.00
Ppto. Comprometido	0.00	106,020.00	0.00	106,020.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	306,280.00	106,020.00	0.00	412,300.00
Ppto. Devengado	306,280.00	70,680.00	0.00	376,960.00
Estimado a fin de año	* 306,280.00	0.00	0.00	306,280.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	106,020.00	0.00	106,020.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	66.67 %	0.00 %	91.43 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

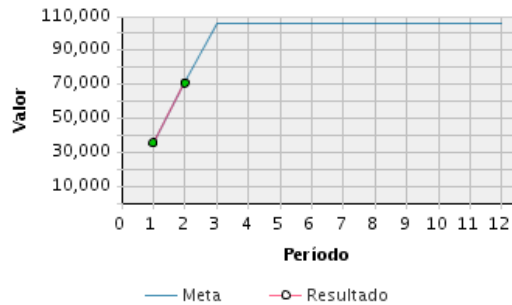

Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	35,340.00	35,340.00	35,340.00	35,340.00	100.00 %	●	33.33 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	35,340.00	35,340.00	70,680.00	70,680.00	100.00 %		66.67 %
Mar	35,340.00		106,020.00				
Abr	0.00		106,020.00				
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	106,020.00	70,680.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
9	Incrementar la satisfacción de los usuarios en los Servicios de Salud MEDIANTE convenios con la red complementaria, la remodelación de la infraestructura, adquisición de tecnología médica de punta, capacitación al talento humano, e implementación de las TICs, y aplicación de encuestas periódicas a los usuarios, gestionar el incremento de médicos especialistas.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 1.- Perfil del proyecto	A_1.pdf	30/01/2014
2	ASOCIACIÓN AL HITO 21.- Planilla de pago septiembre	C_3.PDF	10/02/2015
3	ASOCIACIÓN HITO 10.- Informe del señor Administrador del contrato del 11 al 30 de abril del 2014	B_1.pdf	02/06/2014
4	ASOCIACIÓN HITO 11.- Planilla pagada del 11 al 30 de abril 2014	B_2.pdf	25/07/2014
5	ASOCIACIÓN HITO 12.- Informe administrador del contrato del 01 al 30 de mayo 2014	B_3.pdf	25/07/2014
6	ASOCIACIÓN HITO 13.- Planilla pagada del mes de Mayo 2014	B_4.pdf	25/07/2014
7	ASOCIACIÓN HITO 14.- Informe Administrador del contrato del 01 al 30 de junio del 2014	B_5.pdf	25/07/2014
8	ASOCIACIÓN HITO 15.- Planilla pagada del mes de Junio 2014.	B_6.pdf	25/07/2014
9	ASOCIACIÓN HITO 16.- Informe actividades del 01 al 30 de julio 2014	B_7.pdf	18/08/2014
10	ASOCIACIÓN HITO 17.- Planilla pagada del mes de Julio 2014	B_8.pdf	17/09/2014
11	ASOCIACIÓN HITO 18.- Informe de actividades del 01 al 31 de agosto 2014	B_9.pdf	17/09/2014
12	ASOCIACIÓN HITO 19: Planilla de pago agosto 2014	C_1.pdf	08/10/2014
13	ASOCIACIÓN HITO 2.- Acta de Constitución	A_2.pdf	30/01/2014
14	ASOCIACIÓN HITO 20: Informe mes de septiembre 2014	C_2.pdf	08/10/2014
15	ASOCIACIÓN HITO 22.- Infome mes de Octubre 2014	C_4.pdf	10/02/2015
16	ASOCIACIÓN HITO 23.- Planilla pagada Octubre 2014	C_5.pdf	10/02/2015
17	ASOCIACIÓN HITO 24.- Informe del mes de Noviembre 2014	C_6.pdf	10/02/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	ASOCIACIÓN HITO 27.- Autorización extensión plazo para la culminación del proyecto	C_9.pdf	10/02/2015
19	ASOCIACIÓN HITO 28.- Planilla pagada del mes de diciembre 2014	D_1.pdf	10/02/2015
20	ASOCIACIÓN HITO 29.- Autorización Contrato complementario	D_2.pdf	10/02/2015
21	ASOCIACIÓN HITO 3.- Certificación presupuestaria	A_3.pdf	17/02/2014
22	ASOCIACIÓN HITO 30.- Contrato ampliatorio firmado	D_3.pdf	11/03/2015
23	ASOCIACIÓN HITO 31.- Informe del 01 al 31 de enero del 2015	D_4.pdf	11/03/2015
24	ASOCIACIÓN HITO 32.- Planilla pagada de mes de enero 2015	D_5.pdf	11/03/2015
25	ASOCIACIÓN HITO 33.- Informe del 01 al 28 de febrero del 2015	D_6.pdf	11/03/2015
26	ASOCIACIÓN HITO 4.- Pliegos publicados y aprobados	A_4.pdf	18/02/2014
27	ASOCIACIÓN HITO 5.- Proceso de puja	A_5.pdf	11/03/2014
28	ASOCIACIÓN HITO 7.- Resolución de Adjudicación fallido	A_7.pdf	14/04/2014
29	ASOCIACIÓN HITO 8.- Resolución de adjudicación.	A_8.pdf	30/04/2014
30	ASOCIACIÓN HITO 9.- Contrato firmado	A_9.pdf	30/04/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Echeverría Guerra, Carmen del Pilar	Coordinador Financiero
Proaño Paredes, Alfredo Fabian	Coordinador Administrativo
Rubio Rivera, Maria Angelita	Lider del Proyecto
