

PN - Policía Nacional del Ecuador
Dirección Nacional de Salud
Hospital Guayaquil

PROYECTO: I012 Digitalización de las Historias Clínicas de los pacientes

Líder del Proyecto:	Vera lamila, Gisella (gvera@hdpng2.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón	Programas Relacionados:	
Titular:	Torres Arboleda, Carlos Fabián	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Tecnología	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/01/2015 - 23/10/2015
Fecha de última actualización:	06/04/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Torres Arboleda, Carlos Fabián	Fecha del siguiente Hito:	06/04/2015

DATOS GENERALES

Descripción

El objetivo de eliminar el papel en la gestión asistencial comportó en nuestro Departamento la digitalización de historias clínicas. El proceso de digitalización además de permitir el acceso electrónico a los datos de la historia clínica permite resolver un problema creciente de necesidad de espacio en el archivo.

Beneficios Cualitativos

Agilidad en la búsqueda, fundamental para la rápida atención del paciente.
 Acceso inmediato y concurrente a la documentación. Al tener la historia clínica digitalizada, Varios usuarios pueden acceder al mismo documento sin necesidad de esperas.
 Importante reducción de espacio físico que habitualmente está en zonas donde el espacio para el archivo es muy costoso.
 Utilización de la estructura de seguridad de usuarios para proteger la información, hoy en día prioritario al tratarse de información sensible
 Eficacia y ahorro de tiempo en la gestión
 Seguridad de las Historias Clínicas, los originales se mantienen en archivos, no se pierden ni se deterioran.

Tipo de Beneficiario

INTERNO: Personal Técnico y Administrativo

EXTERNO: Pacientes.


Restricciones

TIEMPO: Que el Proyecto debe de terminar en el tiempo estipulado según cronograma.
 COSTO: El valor del proyecto no debe sobrepasar el valor calculado en el cronograma valorado
 ALCANCE: Se debe realizar el proyecto de acuerdo a lo establecido en los términos referenciales.
 RESULTADOS: Digitalizar 100.000 historias clínicas.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	-------------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 31.51 %
 Fecha de Inicio: 05/01/2015 Fecha de Fin: 23/10/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

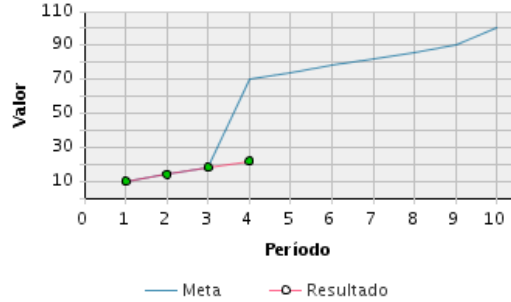

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	10 %	14 %	18 %	70 %	74 %	78 %	82 %	86 %	90 %	100 %		
	Avance real acumulado											
	10 %	14 %	18 %	22 %								
Estado												
	●	●	●	●								

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Marzo 20: Se realiza la aprobación de los pliegos por parte del equipo (Hito 6) Marzo 18: Se procede a cerrar el riesgo La Falta de asignación presupuestaria CAUSARÍA que no se ejecuten el proyecto el mismo que fue mitigado Marzo 12: Se procede a cerrar la acción Se debe insistir ante el Ministerio de Finanzas para que asigne el presupuesto necesario para poder iniciar el proyecto el mismo que fue mitigado Marzo 06: Se procede con el equipo de trabajo al análisis de los pliegos (Hito 5)	Torres Arboleda, Carlos Fabián	06/04/2015 - 09:57 AM
Febrero 25.- Se procede a realizar el análisis de Especificaciones Técnicas para la contratación del Proyecto de Digitalización(Hito relacionado 3) Febrero 06.- Se realiza el analisis de Requerimiento con el equipo del proyecto (Hito relacionado 4)	Torres Arboleda, Carlos Fabián	06/03/2015 - 10:31 AM
Enero 15.- Se aprueba el ACTA DE CONSTITUCION del proyecto (Hito relacionado 2). Enero 08.- Se llama a reunion para la elaboración del Acta de Constitución. (Acta de Reunion No.003). Enero 05.- Se recibe por parte de la DIRPLAN la aprobación del proyecto (Hito relacionado 1).	Torres Arboleda, Carlos Fabián	05/02/2015 - 04:55 PM

Riesgos cerrados: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Documento Validado	1-Solicitud de Información	05/01/2015		05/01/2015	●	Sí	0.0
2	DEFINICIÓN: Acta de Constitución aprobada.	1-Solicitud de Información	15/01/2015		15/01/2015	●	Sí	10.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	PLANIFICACIÓN: Análisis de Requerimiento, elaborado	1-Solicitud de Información	06/02/2015		06/02/2015		Sí	2.0
4	PLANIFICACION: Análisis de Especificaciones Técnicas, Elaborado	1-Solicitud de Información	25/02/2015		25/02/2015		Sí	2.0
5	PLANIFICACIÓN: Análisis de Pliegos, validado	2-Publicación de Pliegos	06/03/2015		06/03/2015		Sí	2.0
6	PLANIFICACIÓN: Aprobación de pliegos por parte del equipo, aprobado	2-Publicación de Pliegos	20/03/2015		20/03/2015		Sí	2.0
7	PLANIFICACIÓN: Procesos pre contractuales, iniciado.	2-Publicación de Pliegos	03/04/2015		03/04/2015		Sí	4.0
8	EJECUCIÓN: Avances del proyecto, informado	5-Entregables Intermedios	06/04/2015	06/04/2015			No	2.0
9	EJECUCIÓN: Avances del proyecto, informado	5-Entregables Intermedios	15/04/2015	15/04/2015			No	2.0
10	PLANIFICACIÓN: Acta de adjudicación, aprobada	3-Adjudicación	24/04/2015	24/04/2015			No	2.0
11	EJECUCIÓN: Avances del proyecto, informado	5-Entregables Intermedios	30/04/2015	30/04/2015			No	2.0
12	EJECUCIÓN: Primer Anticipo, entregado	4-Inicio de Trabajo	30/04/2015	30/04/2015			No	40.0
13	EJECUCIÓN: Avances del proyecto, informado	5-Entregables Intermedios	15/05/2015	15/05/2015			No	2.0
14	EJECUCIÓN: Avances del proyecto, informado	5-Entregables Intermedios	22/05/2015	22/05/2015			No	2.0
15	EJECUCIÓN: Avances del proyecto, informado	5-Entregables Intermedios	05/06/2015	05/06/2015			No	2.0
16	EJECUCIÓN: Avances del proyecto, informado	5-Entregables Intermedios	26/06/2015	26/06/2015			No	2.0
17	EJECUCIÓN: Avances del proyecto, informado	5-Entregables Intermedios	02/07/2015	02/07/2015			No	2.0
18	EJECUCIÓN: Avances del proyecto, informado	5-Entregables Intermedios	24/07/2015	24/07/2015			No	2.0
19	EJECUCIÓN: Avances del proyecto, informado	5-Entregables Intermedios	05/08/2015	05/08/2015			No	2.0
20	EJECUCIÓN: Avances del proyecto, informado	5-Entregables Intermedios	21/08/2015	21/08/2015			No	2.0
21	EJECUCIÓN: Avances del proyecto, informado	5-Entregables Intermedios	03/09/2015	03/09/2015			No	2.0
22	EJECUCIÓN: Avances del proyecto, informado	5-Entregables Intermedios	25/09/2015	25/09/2015			No	2.0
23	CIERRE: Acta entrega recepción, aprobada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	23/10/2015	23/10/2015			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial				
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar				
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998				
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

11	Incrementar la efectividad de la prestación de los Servicios de Salud MEDIANTE la implementación de procesos administrativos, capacitación del talento humano en gestión por procesos, aplicar protocolos técnicos médicos, proporcionar la información a la DNS sobre la cartera de servicios.
13	Incrementar el uso optimo del presupuesto MEDIANTE una adecuada gestión, planificación, ejecución y monitoreo del presupuesto asignado para el aprovisionamiento de insumos medicinas, mobiliario y mantenimiento de equipos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 1.- VALIDACIÓN DEL PROYECTO	digitalizacion.ante proyecto.PDF	23/01/2015
2	ASOCIACIÓN HITO 2.- Acta de Constitución	digitalizacion-acta.PDF	06/03/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Torres Arboleda, Carlos Fabián	Patrocinador del Proyecto

Nombre	Rol
Vega Vinueza, Jimmy José	Líder Técnico
Vera Iamila, Gisella	Lider del Proyecto
Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón	Patrocinador Ejecutivo
Vinueza Espinoza, Gonzalo Manuel	Patrocinador Financiero
